

ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка за услуги

Областна администрация Хасково
АСД-04-10 / 12.06.2018
Областна администрация
Хасково / Договор
<http://www.hs.government.bg>
ПКС: NMD119B5 / ДН: 8933536

Днес, 12.06 2018 година, в град Хасково, между:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО с адрес: гр. Хасково п.к. 6300, пл. „Свобода“ № 5, БУЛСТАТ 836147490, представлявана от **СТАНИСЛАВ НАСКОВ ДЕЧЕВ** – Областен управител на област Хасково и **ЯНКА ЦАНКОВА ГЪБОВА** – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, п.к. 6600, ул. „Булаир“ № 14, вх.А, ет.1, ап.1, ЕИК 108507750 и ДДС номер BG 108507750, представлявано от **НАДЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА**, в качеството на управител, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**¹, от друга страна,

1

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и утвърдени на основание чл.97, ал.4 от ИПЗОП протоколи от 22.05.2018 и 01.06.2018г. от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет „Изготвяне инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково“, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“, след събиране на оферти по реда на

¹ Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението, и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.

глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави на свой риск срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следната услуга:

- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: *„Поддържане на десния бряг на р. Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково“*, наричана за краткост „Услугата“, съдържащ следните проектни части:

- Част „Хидротехническа“
- Част „Хидроложки доклад“
- Част „Геодезическо заснемане“
- Част „Геология и хидрогеология“
- Част „ПУСО“
- Част „ПБЗ“ с организация на строителството
- Част „Сметна документация“ с подробна количествено стойностна сметка.

2

Проектът е за строеж първа категория, съгласно чл.137, ал.1, буква „ж“от ЗУТ и чл.2, ал.7 на Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугата в съответствие с Техническите спецификации и Идейния проект, Техническото си предложение и Ценовото си предложение, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и има действие до датата на издаване на Разрешение за строеж.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугата започва да тече от датата на влизане в сила на договора и е 45 календарни дни за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ и предаването му в пълен обем и качество, в изискуемия вид в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител (CD) във формат pdf. или еквивалентен, включително графичните и табличните материали, по всички изискуеми части от Възложителя.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е на офисът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посещения на място на обекта.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 19 890,00 (словом: **деветнадесет хиляди осемстотин и деветдесет**) лева без ДДС, представляващи 23 868,00 (словом: **двадесет и три хиляди осемстотин шестдесет и осем**) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № [3].

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата, включително пътни разходи, разходи за консумативи и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите подизпълнители, ако е приложимо, както и други допълнителни разходи, които биха могли да възникнат, при осъществяване на предмета на договора, в това число и отстраняване на констатираните несъответствия в хода на приемане и одобряване на проекта като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за изпълнението на Услугата, за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се считат за включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

(а) авансово плащане в размер на 10% (десет на сто) от Цената – в срок до 10 (*десет*) дни, считано от датата на подписването на Договора и одобряване на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет – Министерския съвет;

(б) междинно плащане в размер на 65 % (шестдесет и пет на сто) от Цената – в срок до 10 (*десет*) дни, считано от датата на Приемо-предавателния протокол за изготвения инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по чл.28 и 29 в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител (CD) във формат pdf. или еквивалентен, включително графичните и табличните материали и доклад от Ръководителя на проекта за преглед пълнотата на предадената работа.

(в) окончателно плащане в размер на остатъка от Цената – в срок до 10 (*десет*) дни, считано от датата на издаване на Разрешение за строеж по изготвения инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обекта.

Чл. 9. (1) Плащанията по този Договор се извършват въз основа на следните документи:

1. Авансовото плащане по чл.8, б.(а) от Договора се извършва въз основа на фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Междинното плащане чл.8, б.(б) от Договора се извършва въз основа на фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изготвен инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, надлежно подписан и подпечатан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител (CD) във формат pdf. или еквивалентен, включително графичните и табличните материали и доклад от Ръководителя на проекта за преглед пълнотата на предадената работа, съответно спазване на разпоредбите за Предаване и приемане на изпълнението от Договора;
3. Окончателното плащане по чл.8, б.(в) от Договора се извършва въз основа на фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и издадено Разрешение за строеж по изготвения инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обекта.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в посочените срокове, при спазване на условията по ал. 1 и одобряване на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет – Министерския съвет.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

BIC: PRCBGBSF

IBAN: BG45PRCB923010497001

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11² (1) Когато за частта от Услугата, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугата за съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугата, при съответно спазване на разпоредбите за Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

² Клаузата е действаща в случай, че изпълнителят ще използва подизпълнители.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно **994,50 лева (словом: деветстотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки)** („Гаранцията за изпълнение“ Приложение № 5), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора и се представя под формата на парична сума³.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора⁴, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: **Търговска банка Д АД**

BIC: **DEMIBGSF**

IBAN: **BG 23 DEMI 9240 3300 1169 75**

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

³ Посочва се формата, избрана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предвид разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

⁴ Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл. 111, ал. 2, изр. последно, и чл. 116, ал. 1, т. т. 1, 2, 3 и 6, и чл. 116, ал. 4 ЗОП.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни след прекратяването на Договора и изпълнението на Услугата в пълен размер включително издадено Разрешение за строеж, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугата не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (*пет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
3. да иска от Възложителя да приеме извършената работа съобразно изискванията на настоящия договор.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави Услугата и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционен проект във фаза „работен проект“ по всички изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ части и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугата, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. да извърши възложената му работа с подходящи технически средства и материали, като отговаря за доброто им качество.
10. разработи инвестиционен проект във фаза Работен проект, при спазване на разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и другата приложима нормативна уредба, отговарящ на изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
11. при разработването на инвестиционния проект в работна фаза следва да се спазват изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и чл.143, ал.1, т.2 и т.4 от ЗУТ. Инженерните изчисления, обосноваващи проектните решения, да са в необходимата пълнота и структурно съответствие. Работният проект да включва работни чертежи и детайли, които да изясняват проектните решения и технологията на изпълнение на отделните видове СМР, в степен осигуряваща цялостно изпълнение на всички видове СМР в съответствие на добрите строителни практики, безопасност на труда и опазване на околната среда.
12. да извърши проектирането на база на изготвения идеен проект и комбинирана скица за проектиране, издадена от Община Димитровград, както и при разработката да се има предвид, че проектът е съгласно мярка 756 (МА_04_24) от „План за управление на риска от наводнения” на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.
13. При установяване на грешки, непълноти и/или при нужда от корекция в изготвеното от Изпълнителя, същите следва да бъдат отстранени от Изпълнителя без допълнително заплащане и в срок, определен от Възложителя или компетентния орган.
14. да предаде на Възложителя изготвените материали, разработени, подпечатани и подписани от лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за Камарите на инженерите в инвестиционното проектиране.
15. да разработи работния проект така, че да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи (СМР); да се осигури възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство; да се осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;
16. разработването на проектната документация да е от лица с пълна проектантска правоспособност, които да притежават застраховка професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на

неправомерните им действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с проектирането, са за сметка на Изпълнителя.

17. Разработеният проект се представя на Възложителя в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител (CD) във формат pdf. или еквивалентен, включително графичните и табличните материали.

18. при поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да му предоставя информация за изпълнението на възложените проектни работи. Той е длъжен да осигури възможност на определени от Възложителя длъжностни лица да проверяват изпълнението на работите.

19. да докладва и защитава при необходимост изпълнените проектни работи при съгласуването/утвърждаването им от съответните държавни органи, в това число и при евентуално съдебно оспорване.

20. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугата в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвеното или съответна част от него;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на изготвеното, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
5. да не приеме някои от разработките, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
6. да иска изпълнение на възложената работа в срок, съгласно Техническите спецификации и Идеения проект и при спазване на нормативните изисквания за видовете работи.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 43 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 17/22 от Договора;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугата се извършва с придружително писмо и се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в три оригинални екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
 2. да поиска преработване и/или допълване на разработките/материалите, включително и при установени несъответствия или констатиранни недостатъци, в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.
- (2) След депозиране на изготвения инвестиционен проект във фаза „работен проект“, Възложителят има 5 дни за преглед пълнотата на предадената работа.
- (3) В срока по ал.2 се изготвя доклад от Ръководителя на проекта въз основа прегледа за пълнота на предадената работа/материали съдържащ отразяване, дали работата е изпълнена в пълен обем (разработени са всички части на проекта и е изготвена количествено – стойностна сметка по всички части) и е в изискуемия от Възложителя вид в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител (CD) във формат pdf. или еквивалентен, включително графичните и табличните материали.

10

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. При просрочване изпълнението на задълженията, съгласно срока, посочен в чл.5 от този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден от Цената по чл.7, ал.1 за всеки ден забава, но не повече от не повече от 30 % (тридесет) на сто от цената по чл. 7, ал. 1.

Чл. 31. При констатирано лошо⁵ или друго неточно⁶ или частично изпълнение⁷ на отделна дейност или при съществено отклонение⁸ от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в

⁵ „Лошо изпълнение“ е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си с по-ниско от изискуемото качество.

Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения" (FLOOD PROTECTION),
съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.

Техническите спецификации и Идейния проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от Цената на Договора.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 34. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

⁶ „**Неточно изпълнение**“ означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно неизпълнение или частично изпълнение;

⁷ „**Частично изпълнение**“ е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното изпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

⁸ „**Съществено отклонение**“ по смисъла на настоящия договор е такова отклонение, което коренно променя първоначалната идея, предвидена в Идейния проект и по същество си представлява съвсем различно предложение.

Чл. 36. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато и повторното изпълнение на услугата е некачествено по смисъла и реда на чл.31.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 37. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

2. едностранно с двуседмично писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

а) отменено предписание или заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които са настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от Цената за изпълнение на Договора;

б) системно и неоснователно забавяне изпълнението на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на строителството или неоснователно забавяне въвеждането на строежа в експлоатация;

в) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

г) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора;

д) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

е) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ж) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

з) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

и) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установят обстоятелства, представляващи нарушение на нормативни разпоредби.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугата, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (*десет*) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 49. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: град Хасково п.к. 6300, пл. „Свобода“ № 5

Тел.: 038/608011, 038/608025.

Факс: 038/608050

e-mail: oblast@hs.government.bg

Лица за контакт: Станислав Дечев, Венета Вълканова, Желязко Колев.

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: град Кърджали, п.к. 6600, ул. „Булаир“ № 14, вх.А, ет.1, ап.1

Тел.: 0361/61110

Факс: 0361/61110

e-mail: ekoinjenering@abv.bg

Лице за контакт: Надя Петкова

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 51. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

Приложимо право

Чл. 52. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 53. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд по седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Екземпляри

Чл. 54. Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 55. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

- Приложение № 1 – Технически спецификации и Идеен проект;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;
- Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО:

/С.ДЕЧЕВ/

ЯНКА ГЪБОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Я.ГЪБОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ БООД
ГР. КЪРДЖАЛИ

/Н.ПЕТКОВА-УПРАВИТЕЛ/

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017 г.
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Областна администрация Хасково е възложител на обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково“, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“.

Целта на проекта е да се извърши укрепване и в голяма степен възстановяване на участък на десния бряг на р.Марица при шахтови кладенци за водоснабдяване от № 29 до № 36, намиращ се между землищата на с. Великан и с.Ябълково и изземване на наносните отложения към левия ѝ бряг на същия участък, с цел възстановяване на основното течение откъм левия бряг и подобряване проводимостта на реката.

Промяната в посочения участък на р. Марица най-вероятно е свързана с извършените строителни работи за намиращия се малко по-надолу по течението мост на магистрала „Марица“. За преминаването на техника във връзка с изпълнението, при моста е засипан десен ръкав на реката със скални маси. При завършването на строителството е трябвало да бъде възстановно течението по ръкава, но е останал засипан. В резултат водата разрушава десния бряг по-нагоре по течението и приближава застрашително към разположените в заливаемата берма водоснабдителни кладенци, както и към предпазната дига, зад която в близост се намират ж.п линията и обработваеми земеделски земи. Разрушен е тръбен водосток на р.Хасарска,

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020

Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави

Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.

осигуряващ достъп до СОЗ пояс I на шахтови кладенци от № 31 до № 36. Изровен е значителен участък от терена около него и е открит напорния водопровод. Застрашени от срутване са два броя ЖР, запазващи с ток новите бункерни помпени станции. Съборена е част от оградата на СОЗ пояс I. При БПС № 29 и БПС № 30, брегът е отнесен и е достигнал на 30 м – 40 м от шахтовите кладенци.

Необходимостта на инвестиционното намерение произтича от процес, при който водите на реката непрекъснато ерозират десния ѝ бряг в посочения участък. Образувалите се наносните отложения запущват някогашния по-широк ръкав откъм левия бряг, като са се образували група от три острова, от които само най-големия е съществувал с много по-малки размери. От образувалите се наноси е засипано съоръжение за водовъзвращане на „Напоителни системи“ ЕАД, което е полупружено с течение на времето.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ - ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. ИЗХОДНИ ДАННИ:

Местонахождение: Участък на десния бряг на р.Марица при шахтови кладенци за водоснабдяване от № 29 до № 36 и наносните острови в този участък, намиращ се между землищата на с. Великан и с.Ябълково, съгласно приложена извадка от топографска карта към техническото задание.

Собственост: Публична държавна собственост в управление на Министъра на земеделието и храните, съгласно Закона за водите.

Възложител: Областна администрация Хасково, съгласно писмо изх.№ 06-41/16.02.2017 г. на МЗХ.

Строежът е първа категория, съгласно чл.137, ал.1, буква „ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7 на Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Изготвен е инвестиционен проект във фаза „идеен проект“. Издадена е комбинирана скица за проектиране от Община Димитровград. Проектът се разработва съгласно мярка 756

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017 г.
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.
(МА_04_24) от „План за управление на риска от наводнения“ на Басейнова дирекция
„Източнотеломорски район“ и съгласуване с РИОСВ.

Съгласно съгласувателни писма от РИОСВ Хасково и Басейнова дирекция „Източнотеломорски район“ Пловдив, обектът попада: в границите на водно тяло „р.Марица от вливане на р.Омуровска до вливане на р.Съзлийка“ с код BG3MA350R212; в границите на зона за защита на водите – защитена зона „Река Марица“ с код BG0000578; в границите на зона за защита на водите – защитена зона „Марица – Първотай“ с код BG0002081; зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р.Марица“ с код BGCSARI06; в район със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ BG3_APSFR_MA_04 – Марица – Димитровград, определен в ПУРН 2016-2021 на ИБР. Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.46, ал.1, т.1, б.„г“ от Закона за водите и е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Допускане на сечи на естествена крайбрежна растителност само при доказана необходимост за осигуряване проводимостта на реката;
- Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водното тяло и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката;
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е в процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие.

2. ОБХВАТ, ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Да се разработи инвестиционен проект във фаза „работен проект“, отговарящ на изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, при спазване на разпоредбите на нормативната уредба в Република

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries

Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020

Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави

Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.

България и нормите за проектиране на подобни обекти. Проектирането да се извърши въз основа на изготвения инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ и комбинирана скица за проектиране, издадена от Община Димитровград. При разработката да се има предвид, че проектът е съгласно мярка 756 (MA_04_24) от „План за управление на риска от наводнения“ на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С работния проект да се предвидят надлъжни и напречни брегоукрепителни съоръжения и да се прецени обема за изземване на наносите от образувалите се острови. Да се предвиди напречно съоръжение по линията на съществуващото полуразрушено каменно съоръжение в реката, съгласувано с „Напоителни системи“ ЕАД.

При възстановяването на брега да се предвиди за засипването между напречните съоръжения да се използва по възможност подходящ материал от образувалите се острови.

В работния проект да се предвиди възстановяването на течението по засипания ръкав под моста на магистрала „Марица“, като се използва скалния насипен материал от засипания ръкав на реката за възстановяването на брега при брегоукрепващите съоръжения.

Да се даде решение за растителността, предвидена за премахване от островите.

Да се предвиди достъп до обекта с постоянните и временни пътища за обслужване на обекта, връзки до депа за наносни отложения, строителни и растителни отпадъци.

Да се прецени какъв обем материал ще е необходимо да бъде прехвърлен от коритото на реката за укрепване на брега, както и обема материал за депо. Да се проучи къде може да се използва депо и на какво разстояние.

Работният проект да съдържа следните проектни части:

Част „Хидротехническа“

Част „Хидроложки доклад“

Част „Геодезическо заснемане“

Част „Геология и хидрогеология“

Част „ПУСО“

Част „ПБЗ“ с организация на строителството

Част „Сметна документация“ с подробна количествено стойностна сметка

Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020

The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries

Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017 г.

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020

Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави

Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.

Частите на работния проект да бъдат разработени въз основа на хидроложки, геоложки и хидрогеоложки проучвания, геодезическо заснемане, съобразени с КВС и друга необходима картна, планова и кадастрална основа, с обосновка на проектното решение - вида и избрания начин на изпълнение.

Работният проект да съдържа по съответните части:

1. Обяснителна записка, изчисления, приложения;
2. Чертежи в подходящ мащаб, които изясняват предлаганото проектно решение – геодезическо заснемане на съществуващото положение с дължини и коти в М 1:1000, ситуационен план на брегоукрепващите съоръжения, надлъжни и напречни профили с дължини, наклони и коти, монтажен план, детайли и др.;
3. Спецификация на материали, механизация и труд;
4. Опазване на околната среда и опазване на хумуса;
5. Подробна количествено стойностна сметка.

Всички части на проекта да се разработят от лицензирани лица, членове на КИИП с пълна проектантска правоспособност и валидна застраховка „Професионална отговорност“.

Необходимото съгласуване на работния проект със съответните инстанции ще се извърши от възложителя със съдействието на проектанта.

Проектантът отразява изискванията на съгласувателните писма в проекта и предава на възложителя окончателния проект надлежно подписан и подпечатан в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на магнитен носител.

При установени неточности и пропуски в инвестиционния проект от възложителя или надзора в инвестиционното проектиране, проектът се преработва от проектаната за негова сметка в указан от възложителя срок.

При разработването на инвестиционния проект в работна фаза следва да се спазват изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и чл.143, ал.1, т.2 и т.4 от ЗУТ. Инженерните изчисления, обосноваващи проектните решения, да са в необходимата пълнота и структурно съответствие. Работният проект да включва работни чертежи и детайли, които да изясняват проектните решения и технологията на изпълнение на отделните видове СМР, в степен



Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017 г.
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.
осигуряваща цялостно изпълнение на всички видове СМР в съответствие на добрите
строителни практики, безопасност на труда и опазване на околната среда.

Организацията на проектирането да осигури последователност за взаимна съгласуваност
на отделните проектни части и изпълнението на услугата в срока на договора.

Приложение: Извадка от топографска карта – 1 бр. лист А4 - копие.

Съставил: Венета Вълканова

Гл. експерт в дирекция АКРРДС

при Областна администрация Хасково

Валиден до
всички 2.3310

ХЕС

гр.Пловдив

СД „ХидроЕкоСтрой”

бул. „Марица” 154, офис В32, тел. 032/632-660

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково“

ЧАСТ: Хидротехническа

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна администрация - Хасково

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хидроекострой – Грозев и сие” СД

Проектанти:

Заложен на осн. чл.2 от ЗЗПД

/ инж. Т. Димова /

Заложен на осн. чл.2 от ЗЗПД

/ инж. В. Пеевска /

Заложен на осн. чл.2 от ЗЗПД

Воден-проектант:

/ инж. Л. Грозев /

Заложен на осн. чл.2 от ЗЗПД

/ Л. Грозев /

	ИМЕНА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО СЪВЕЩАНИЕ
	ИМЕНА ПРОЕКТАНСКА БЮРОКРИЗИСА
Сторис:	Регистрационен № 07146
ВС	МАЖ. ГЕОМЕТАР / Л. Грозев /
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Заложен на осн. чл.2 от ЗЗПД
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Заложен на осн. чл.2 от ЗЗПД
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Заложен на осн. чл.2 от ЗЗПД



февруари, 2017 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОБЩА ЧАСТ

Настоящият идеен проект е изготвен на основание сключен договор между Областна администрация – Хасково, наречена Възложител и „Хидроекострой – Грозев и сие“ СД, наричано Изпълнител и е съгласно Задание за проектиране, изготвено от Възложителя.

Същият предвижда:

1) Възстановяване и укрепване на разрушените участъци от десния бряг на р. Марица, следствие на преминали високи вълни в периода 2006 – 2016 г.

2) Почистване на коритото на р. Марица от отложени наноси под формата на три острова, с цел оформяне на напречен профил, който да отклони речното течение от десния бряг, към централната руслова част, прямо проектната ос.

При изготвянето на проекта са спазени изискванията на Възложителя, представени в приложеното задание за проектиране.

Ползвани са следните материали и нормативи:

- Картен материал в М 1:25000 и М 1:5000
- Норми за проектиране на ХМС – кн.64 „Библиотека на проектанта“, 1991г
- Норми за проектиране на ХТС при корекции на реки
- Закон за устройство на територията
- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Представеното проектно решение е въз основа на конкретни данни за р. Марица, като за целта са извършени следните проучвателни работи:

- Подробен оглед на обекта, за установяване на нанесените поражения на десния речен бряг и състоянието на речното корито
- Геодезически проучвания през периода 2006 – 2008г, когато са преминали най-високите води
- Хидроложки проучвания през периода 2006 – 2008г
- Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания по архивни материали

II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

Разглежданият участък от р. Марица попада в землищата на селата Великан и Ябълково, в района на водовземните съоръжения на водоснабдителна ПС „Ябълково – I-ви подеи“.

В разглеждания участък от реката има съществуващо речно водохващане на „Напонтелни системи“ ЕАД, което е почти разрушено и не функционира.

Обектът отстои на около 2 км северозападно от с. Ябълково и на около 2,5 км югозападно от с. Великан.

Достъпът до обекта е благоприятстван от наличието на съществуващ полски път. Поради това не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа. Околните терени са заети с имоти общинска и държавна собственост, чието предназначение е основно „пасище, мера“ и залесени площи.

Местоположението на обекта е показано на приложената извадка от топографска карта в М 1:25000.

III. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Следствие силната ерозионна дейност на р. Марица в разглеждания участък са се образували група от три острова, които запушват централната руслова част и левия речен ръкав. В резултат на това, основният ръкав на реката се е изместил изцяло откъм десния бряг, като е отнесъл около 50 – 60 м от съществуващата заливаема берма и продължава да я руши. В същото време наносните отложения продължават да запушват левия речен ръкав и групата острови ще се свържат с левия бряг и ще образуват полуостров. Това ще доведе до по-нататъшното разрушаване на десния бряг и разширяване на основния десен ръкав.

Застрашени са реално вододобивните съоръжения на помпената станция, дясната дига, преминаващата в близост жп линия и земеделски земи.

Съгласно изготвените през годините проектни разработки, ширината на кюнетото за провеждане на средномаксималното водно количество ($Q_{\text{ср. макс}}$) следва да бъде 120÷130 м. В момента изместеното речно корито е стеснено до 50÷60 м, следствие на отложените наноси.

IV. ПРОУЧВАНИЯ

I. Категория на обекта

Съгласно чл. 137, буква „ж“ от ЗУТ, обекта е първа категория.

2.Геодезически работи

За проучване на съществуващото положение са ползвани съществуващи геодезически заснемания на разглеждания участък от реката в периода 2006 – 2008г. Допълнително новите граници са заснети с GPS Garmin. Въз основа на тях е изготвена ситуация съществуващо положение в М 1:1000, която послужи за основа на изготвения проект.

3.Хидроложки проучвания

Съгласно изготвен хидроложки доклад за р.Марица при Димитровград през 2013г от „Хидроекострой-Грозев и сие“ СД Максималните водни количества са:

$$Q_{\text{ср.макс}} = 623 \text{ м}^3/\text{сек}$$

$$Q_{5\%} = 1161 \text{ м}^3/\text{сек}$$

$$Q_{1\%} = 1517 \text{ м}^3/\text{сек}$$

$$Q_{0.1\%} = 1937 \text{ м}^3/\text{сек}$$

4.Инженерно-геоложки проучвания

В разглеждания участък р.Марица е оформила коритото си в акумулационна тераса, изградена от алувиални отложения. Тя включва в състава си дребни до едрозърнести пясъци, чакълести пясъци, глинести пясъци и пясъчливи глинни. Речното корито е изградено от алувиални наслаги, представени от глинести пясъци по бреговете и пясъци и чакъли на слоести пластове, които не са издържани.

В обсега на проекта се обхваща основно десен бряг и повърхностния пласт с дълбочина до 3,0 м, който се характеризира с редуващи се пластове от глинести пясъци и среднозърнести до едрозърнести пясъци.

В терасата на реката се формира грунтов поток, подхранван от валежите, който следва течението на реката и се дренира в нея. Нивото на подземните води е високо – от 1 до 3 м.

Хидрогеоложките условия в речната тераса в голяма степен се обуславят от хидроложкия режим на р.Марица, поради наличната пряка хидравлична връзка между подземните води и речния отток.

V.ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

1.Цел на проекта

Целта на настоящия Идеен проект е да даде техническо решение за възстановяване и укрепване на разрушените участъци от

десния бряг, както и почистване на реката от отложените наноси в речното корито. Въз основа на предложеното техническо решение да се изготви количествено-стойностна сметка (КСС) за изпълнение на предложените СМР.

Идейният проект следва да послужи за основа на следващата фаза на проектиране – технически проект.

2. Проектно решение

За постигане целта на проекта, в разглеждания участък е предвидено да се изградят 7 броя надлъжни укрепителни съоръжения от три реда габиони и 4 броя напречни укрепителни съоръжения (буни) от едроломен камък, както и да се почистят отложените наноси в речното корито. За отбиване на водите и връзка на островите и речните брегове са предвидени 3 временни отбивни диги.

Общото ситуационно решение на участъка е показано на ситуация проектно положение в М 1:1000.

➤ Надлъжни укрепителни съоръжения:

- Съоръжение № 1 е с дължина 50м, височина 3м и е разположено под буна 3.
- Съоръжение № 2 е с дължина 70м, височина 3м и е разположено между буна 2 и буна 3.
- Съоръжение № 3 е с дължина 70м, височина 3м и е разположено между буна 1 и буна 2.
- Съоръжение № 4 е с дължина 100м, височина 3м и е разположено между заустването на р.Хасарска и канала от бившето водохващане.
- Съоръжение № 5 е с дължина 30м, височина 3м и е разположено между буна 4 и заустването на р.Хасарска.
- Съоръжение № 6 е с дължина 100м, височина 3м и е разположено над буна 4.
- Съоръжение № 7 е с дължина 150м, височина 3м и е разположено на около 300м над съоръжение № 6.

Надлъжните съоръжения служат да укрепят и предпазят десния бряг от изравяне. Изпълняват се от три реда габиони с размери 3/1/1 и 2/1/1 м. Ширината в основата е 3м, по средата 2м и горе 1м. В основата на съоръженията се изпълнява насип от едроломен камък, закотвен 0,50м в дъното. Височината на скалния насип зависи от дълбочината на водата в реката по време на строителството. Зад надлъжните съоръжения и изровения бряг се предвижда обратен насип с материал от реката, който отгоре се

заскалява. Между насипа и габионите се слага геотекстил, който да предотврати изнасянето на насипа през габионите.

➤ **Напречни укрепителни съоръжения (буни):**

- Буна 4 е с дължина 50 м, височина 2м, и е разположена над заустването на р.Хасарска.
- Буна 1 е с дължина 85м, височина 3м и е разположена под канала на бившето водохващане, в средата на остров 1.
- Буна 2 е с дължина 60 м, височина 2м, и е разположена в края на остров 1.
- Буна 3 е с дължина 40 м, височина 2м, и е разположена в началото на остров 3.

Буните са инклинални /разположени косо на течението/ и служат да затворят новообразувания десен речен ръкав и възстановят изровената заливаема берма. Изпълняват се от едроломен камък. Ширината на короната им е 4 м. Откосът срещу течението е 1:1,33, а под него 1:3.

Речният ръкав между буните се запълва частично с материал от островите.

➤ **Отбивни диги:**

- Дига 1 е с дължина 20м и височина 2м и е разположена в ексксанния участък на съществуващия бент и свързва левия бряг с остров 1.
- Дига 2 е с дължина 30м и височина 2м и е разположена между остров 1 и остров 3.
- Дига 3 е с дължина 40м и височина 2м и е разположена между остров 3 и десния бряг.

Дигите се изпълняват с материал от островите. Те са с ширина на короната 3,50м и откоси 1:1,5.

➤ **Наносни отложения**

Образувана е група от 3 броя острови от наносни отложения, които затварят централната руслова част и левия речен ръкав. Предвижда се с част от тях да се изградят временните отбивни диги, да се извърши обратния насип зад надлъжните съоръжения и да се запълни част от десния речен ръкав между буните. Излишните наносни отложения ще бъдат изнесени от речното корито на депо.

3.Организация на изпълнението

Строителството на обекта следва да се извършва в периода на маловодие в реката.

Започва се с изпълнението на дига 1, за да се осъществи достъпът до групата острови откъм левия бряг. След това се извършват изкопните работи по отваряне на левия речен ръкав. Изкопаният материал се съхранява на депо върху остров 1 и остров 2. След отварянето на левия ръкав водата се отбива в него, като дига 1 се премахва.

Започва се изграждането на буна 4, която изцяло прегражда новообразувания десен ръкав. За предотвратяване връщането на вода в десния ръкав се изграждат дига 2 и дига 3. След изолирането на участъка от десния ръкав, започва изграждането на предвидените съоръжения в него и изнасяне на наносните отложения.

4. Техническа безопасност и охрана на труда

4.1. Общи положения

Поради големия обем на изкопните и насипните работи контролът за спазване изискванията за безопасност на труда ще се изпълнява от управителя на фирмата определена да извършва строителството на обекта.

За управление на строителните, транспортните и всички спомагателни машини, обслужващи обекта се назначават обучени лица с редовни документи за правоспособност.

Новопостъпващите работници се запознават с:

- общите правила по безопасност на труда и специфичните изисквания за съответното работно място;
- използването на първичните средства за противопожарна защита;
- правилата за даване на долекарска помощ;
- принципа на действие и използване на лични предпазни средства и средства за колективна защита;
- плана за предотвратяване на аварии, предимно в частите, засягащи съответните работни места и длъжности.

Работници постъпващи на работа се допускат до самостоятелна работа при спазване изискванията на нормативните документи за инструктаж и обучение по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, което се удостоверява с книгите за инструктаж и обучение.

Забранява се назначаването на самостоятелна работа на работници, които не са запознати с действащите инструкции по безопасност на труда.

Районът на участъците и подходите към тях се обозначават с указателни, предупредителни и забранителни табели, разположени

на подходящи разстояния и съобразени с характера и релефа на местността, както и с устойчивостта на бреговете в различните участъци.

На подходящи места се поставят табели, забраняващи преминаването и престоя на външни лица и транспортни средства в района на обекта, както и влизането в обекта.

Подстъпите към обекта, които представляват опасност за падане на хора или животни, както и пронадания, обрушвания и свличания в границите му се обозначават с предупредителни табели.

4.2.ТБ при работа с багер

- 1) При предвижване на багера на верижен ход по хоризонтални площадки или при изкачване по наклонени трасета, водещите оси на ходовия механизъм се разполагат отзад, а при спускане по наклон - отпред. Празната кофа е по посока на движението на височина до 1м над терена. При движение на багери по наклони, се предвиждат мерки за предотвратяване на плъзгането им.
- 2) Разстоянието от контратежестта на багера до откоса на стъпалото или до обслужващите го транспортни средства е най-малко 1м.
- 3) Не се разрешава разполагането на багери на съседни работни хоризонти при хоризонтално разстояние между тях по-малко от 2,5 пъти радиуса на въртене на багера.
- 4) Не се допуска преминаването на празна или натоварена с материал багерна кофа над кабините на обслужващите го транспортни средства, както и над незащитен електрозахранващ кабел.
- 5) Забранено е товаренето на автосамосвали, когато водача е в кабината, а тя не е защитена с предпазна козирка със специална конструкция.
- 6) При товарене на автосамосвали с незащитени кабинни, шофьорите излизат от кабината и изчакват натоварването извън обсега на багерната кофа.
- 7) При товарене в транспортни средства, багерът се завъртва към транспортното средство от към страната на кабината на багериста.
- 8) По време на работа не се допуска присъствието на хора и спомагателни машини в обсега на багерната кофа.
- 9) При съвместна работа на еднокофови багери, разстоянието между тях е най-малко равно на сумата от радиусите на гребането им. Работа на по-малко разстояние се допуска само при наличието на специален паспорт, утвърден по установения ред.

- 10) За управление и работа с багери се допускат само лица, имащи свидетелство за машинисти или помощник машинисти на багер.
- 11) Преди започване на работа машиниста е длъжен да огледа състоянието на работния забой за неговото състояние съгласно изискванията на ТБ.
- 12) Забранява се:
 - смазването и почистването на въртящи се части по време на работа на багера;
 - да се оставят след ремонт инструменти и части по стрелата на багера.
- 13) При работа не се разрешава приближаване на веригите на багера на разстояние по-малко от 1м от ръба на работния откос, като при това задължително се следи ъгъла на откоса да не е по-голям от 35° към хоризонта.
- 14) От съображения да не се подработва площадката на която е разположен багера, заходката следва да се изземва само "челно".
- 15) След приключване на работа багера да се изтегли на разстояние не по-малко от 10м от ръба на откоса.

4.3. ТБ при работа с автосамосвал

- 1) При започване на работа да се установи техническата изправност на автосамосвала или бордовата кола, като особено внимание да се обърне на спирачките, звуковите и светлинни сигнали.
- 2) Движението на автосамосвалите и бордовите коли да се извършва само по установените за целта пътища със съобразена скорост за дадения участък от пътя. Последният следва да се маркира с необходимите стандартни пътни знаци.
- 3) Движението по карьерните пътища да става без изпреварване.
- 4) Забранява се превозването на хора в коша на автосамосвала и движението на същия е вдигнат кош.
- 5) При товарене на автосамосвала с багер (фадрома) трябва да се съблюдават следните правила:
 - а) Очакващият за натоварване самосвал трябва да е паркиран извън пределите на радиуса на действие на багера (фадромата) и да се придвижи за натоварване само след разрешаващ сигнал на багериста (фадромиста).
 - б) При липса на защитна козирка на автосамосвала водачът трябва да излезе от кабината
 - в) Натоварването на автосамосвала трябва да става отзад или отстрани. Преминаването на кофата (коша) на багера (фадромата) над кабината на автосамосвала е забранено

г) Натовареният автосамосвал може да потегли само след разрешаващ сигнал на багериста (фадромиста)

б) Шофьорите са длъжни да спазват "Правилник за движение на МПС" по всички пътища в РБългария.

4.4. ТБ при работа с фадрома (челен товарач)

1) За управление и работа с фадрома се допускат само лица, имащи свидетелство за водач - професионалист на автомобили или трактор, допълнително минали подготовка за фадромист

2) Преглед, ремонт, смазване и регулиране на фадромата да става само при изключен двигател и с работещ орган (кош) отпуснат върху заравнена и здрава основа.

3) Забранено е качването и слизането на фадромиста по време на движение, а също така да се оставя фадромата без контрол с работещ двигател

4) При работа с фадрома се забранява:

а) да се прави завой с фадромата, ако кошът е задълбан в материала

б) да се застава на и под коша по време на работа и движение на фадромата

в) да се движи при напречни наклони повече от 10° в подъем и спускане повече от 25°

г) да работи на глинести почви в дъждовно време при напречни наклони

4.5. Мерки за ликвидиране на възникнали аварии

1) Мерки при аварии възникнали в резултат на природни бедствия:

- Извеждат се хората от застрашените места
- На пострадалите се оказва първа медицинска помощ и се транспортират до най-близкия медицински пункт.

2) Мерки при аварии възникнали от пожар

- Извеждат се незабавно хората, намиращи се в близост до огнището на пожара.
- Ако има пострадали им се оказва първа помощ и се транспортират до най-близкия медицински пункт.

3) Трябва да се има предвид, че строителните работи ще се извършват непосредствено в коритото на р. Марица и при високи води може да причинят значителни щети и нежелани последици. Ето защо при проливни и продължителни дъждове или обилно снеготопене, техническото ръководство на обекта трябва да поддържа непрекъснатата връзка със службата по метеорология и

хидрология и ако съществува възможност за заливане на строителната площадка, да се вземат незабавни мерки за евакуиране на хората, строителните машини и материали на безопасни места и да не се извършват строителни работи в опасната зона.

5. Опазване, възпроизводство на околната среда, опазване на хумуса и отчуждения

Предвидените строителни работи целят възстановяване и укрепване на разрушения десен бряг и осигуряване на проводимост на коритото на р.Марица в разглеждания участък, чрез разкриване на централната ѝ руслова част. Всичко това е свързано с премахването на наносни отложения под формата на речни острови в коритото на р.Марица между селата Великан и Ябълково. Поради това не се налагат отчуждения и опазване на хумуса.

Всички предвидени дейности следва да се извършват основно в периода на маловодие в реката, извън размножителния период на речната фауна.

След тяхното приключване всички подходи към коритото на реката се премахват, площадката се почиства от строителни, растителни и битови отпадъци.


VI. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След изграждането на предвидените укрепителни съоръжения, трябва да се полагат особени грижи за тях. След всяко преминаване на високи води в реката, трябва да се извършва оглед на съоръженията. При наличие на поражения върху тях, трябва да се вземат мерки за отстраняването им.


Особено внимание трябва да се обръща на надлъжните укрепителни съоръжения от габиони, които не търпят големи деформации. При откриването на силно забелязващи се деформации, съоръженията трябва да се стабилизират чрез насипване пред тях на едроломен камък.


 Министерство на земеделието и горите Република България	КАРТА НА ИДИОГРАФИЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ПРЕДИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА ПРЕДИКАЦИЯ
	Регистрационен № 07148 Док. Л. МЕЗАР В. Г. ГРИН Допълнено към № 2 от 3372
Съставил: С. С. С. С. (инж. С. С. С. С.)	

ИЗВАДКА ОТ ТОПОГРАФСКА КАРТА
М 1:25000

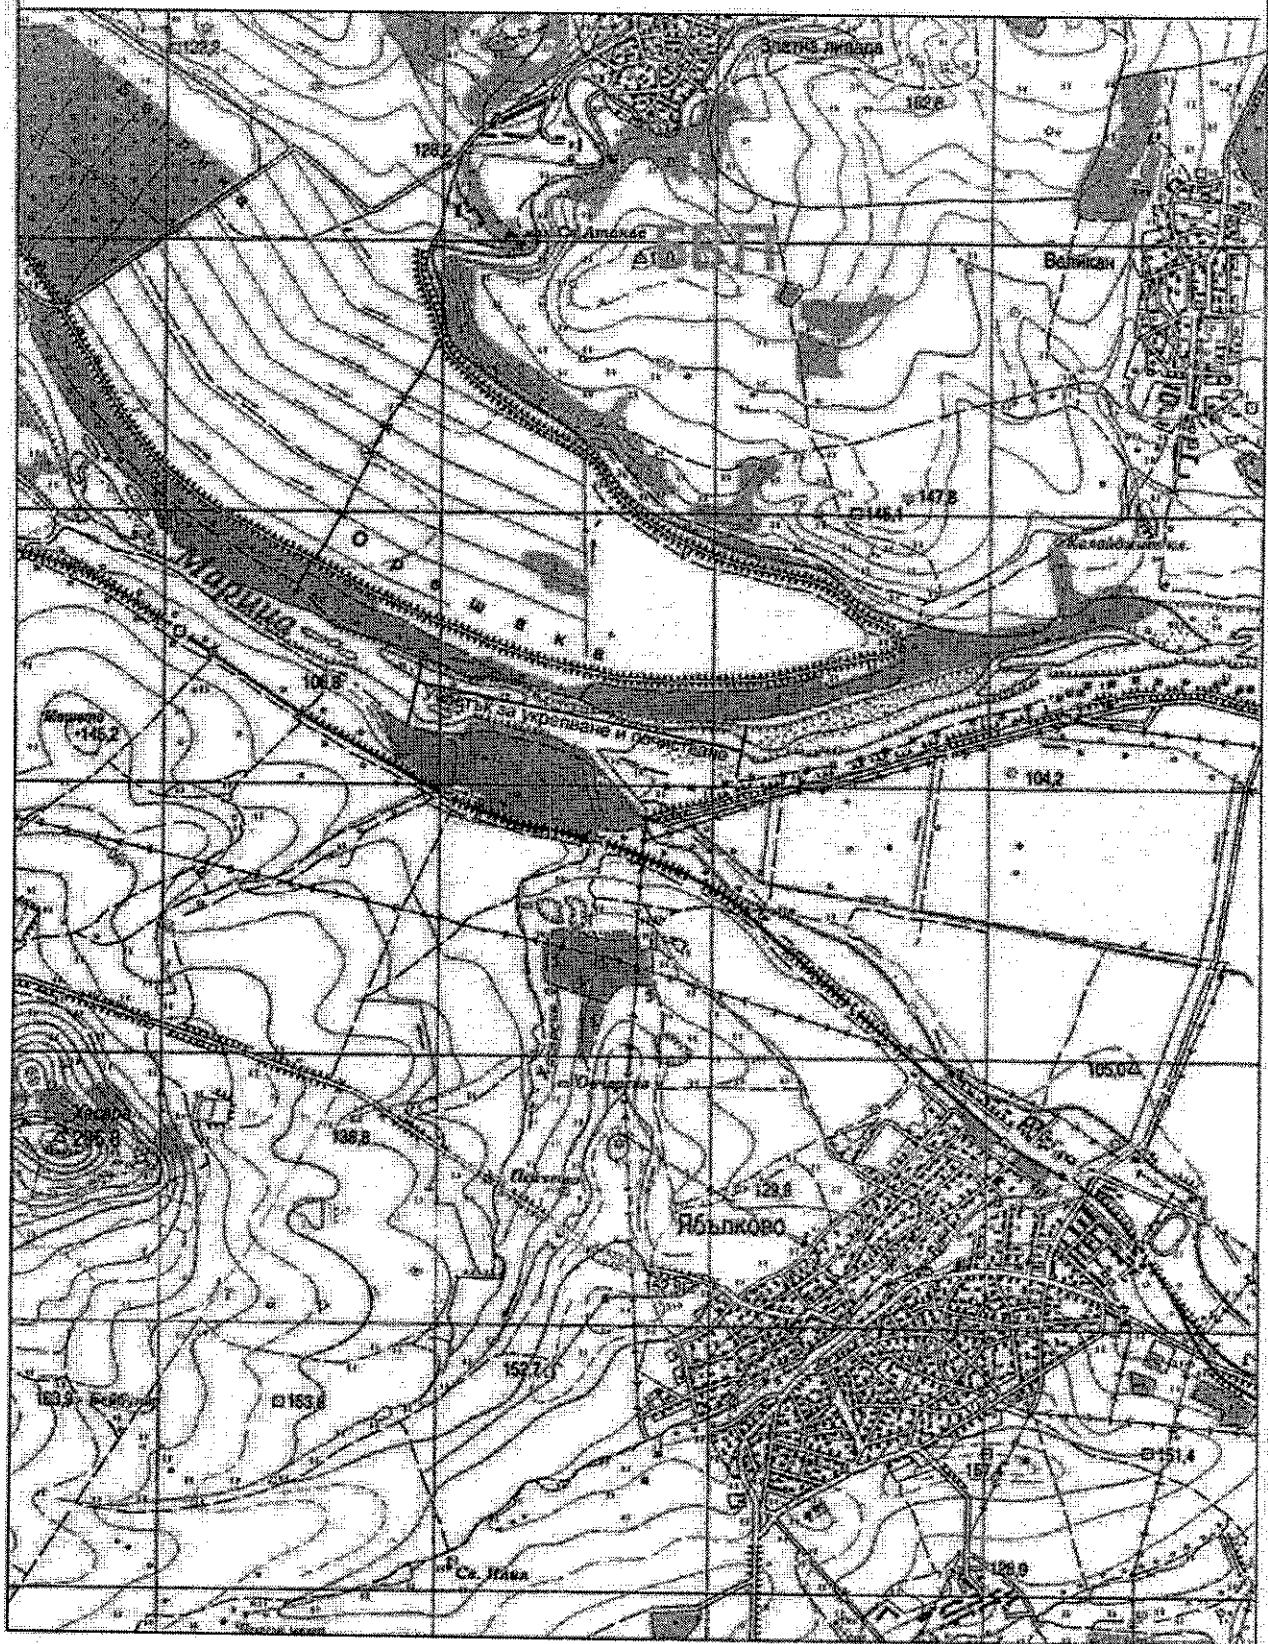

Заличен на осн. чл. 2 от ЗЗД

[illegible]

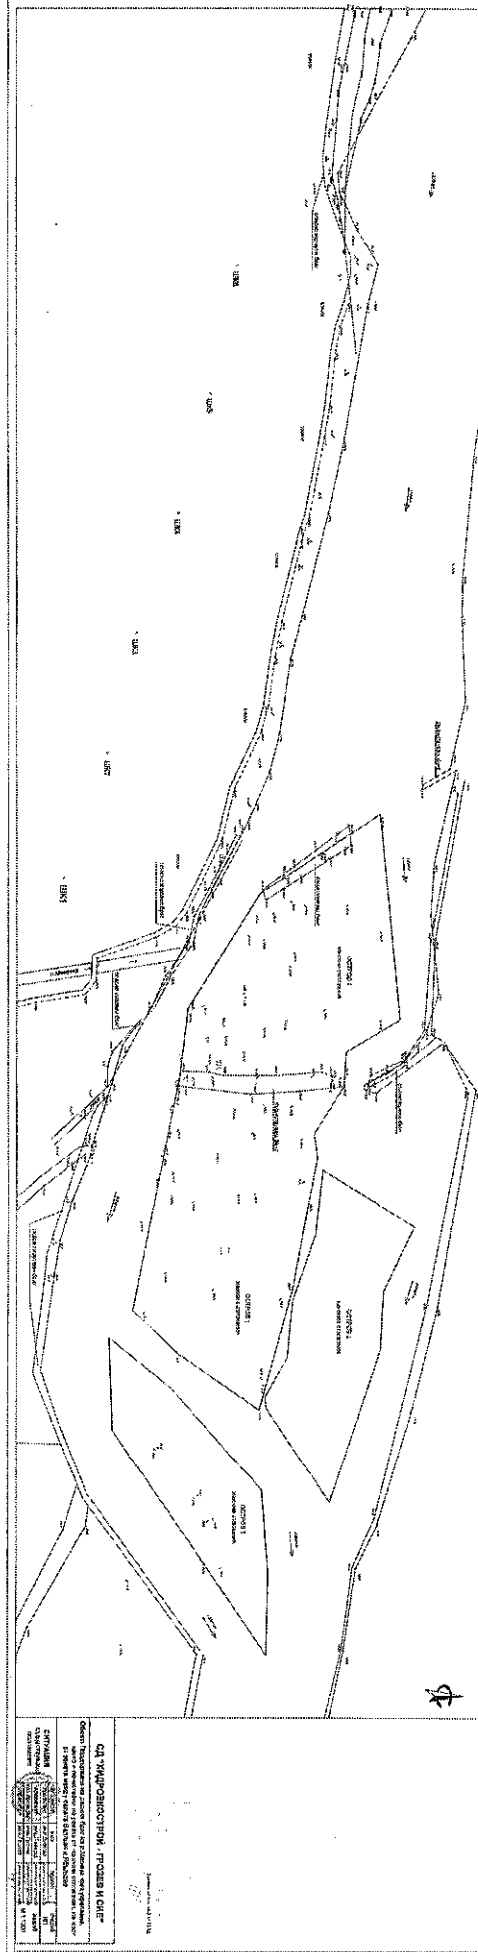

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект:
„Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и
почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата
Великан и Ябълково“, по одобрен проект „Трансгранично планиране и
инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, Акроним: FLOOD
PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата
покана на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –
България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към
климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b
„Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични
рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на
системи за управления на бедствия“**

Долуподписаният/-ната/ Надя Кирилова Петкова, с ЕГН ³⁰¹¹⁵⁷⁸¹ ~~30115781~~ ^в ~~в~~ ^{качеството ми на}
Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява
и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК 108507750, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Булаир“ 14, вх.А,
ет.1, ап.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

След като се запознах(ме) с обява за обществената поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково“, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“, публикувана в Портала за обществени поръчки на страницата на Агенцията за обществени поръчки и на „Профила на купувача“ на страницата на Областна администрация Хасково, както и с техническите спецификации и проекта на договор, свързани с обществената поръчка, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) участника, ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения (FLOOD PROTECTION)", одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ЕООД представям(е) на вниманието Ви следното техническо предложение: /наименование на участника/

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и в пълно съответствие с техническата спецификация и идейния проект.

2. Потвърждаваме, че ще изготвим инвестиционния проект във фаза „работен проект“ при условията на Възложителя, Техническите спецификации и Идейния проект в срок от 45 [четиридесет и пет] календарни дни, определен от Възложителя в публикуваната обява за обществената поръчка и посочен в проекта на договора.


3. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.


4. Декларирам, че съм запознат/а с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, поставените в него условия, приемам ги без възражения и в случай, че представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка, изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

5. Приемаме да се счита обвързани със задълженията и условията, поети с офертата, до 31.05.2018 г.

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

7. Декларирам(е), че при сключването на договор ще представя/им документи, по чл. 67, ал.6 от ЗОП, както и изискуемата гаранция за изпълнение..

Дата	27/ 04 / 2018 г.
Име и фамилия	Надя Петкова
Подпис на лицето и печат	



Cooperation Programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
The Programme is co-funded by the ERDF and by national funds of the participating countries

Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави

Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения" (FLOOD PROTECTION),
съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.

Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект:
„Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и
почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата
Великан и Ябълково“, по одобрен проект „Трансгранично планиране и
инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, Акроним: FLOOD
PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата
покана на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –
България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към
климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b
„Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични
рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на
системи за управления на бедствия“

Долуподписаният/-ната/ Надя Кирилова Петкова, с ЕГН 3411111111, в качеството ми на
Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява
и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)
на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,


(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК 108507750, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Булаир“ 14, вх.А,
ет.1, ап.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

След като се запознах(ме) с обява за обществената поръчка с предмет „Изготвяне на
инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на
р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната
между селата Великан и Ябълково“, по одобрен проект „Трансгранично планиране и
инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, Акроним: FLOOD PROTECTION,
финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за
сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив
и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b
„Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове,
осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на
бедствия“, публикувана в Портала за обществени поръчки на страницата на Агенцията за

Този документ е създаден в рамките на Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения" (FLOOD PROTECTION), одобрен за финансиране по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.




Project "Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection" (FLOOD PROTECTION), Contract № B3.5b.01/11.09.2017
Проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения" (FLOOD PROTECTION),
съгласно сключен Договор № B3.5b.01/11.09.2017 г.

обществени поръчки и на „Профила на купувача“ на страницата на Областна администрация Хасково, както и с техническите спецификации и проекта на договор, свързани с обществената поръчка, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) участника „Екоинженеринг“ ЕООД, представям(е) на вниманието Ви следното ценово предложение: /наименование на участника/

1. Предлагаща цена за изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен проект“: 19 890,00 (словом: деветнадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева), лв. без ДДС, съответно 23 868,00 (словом: двадесет и три хиляди осемстотин шестдесет и осем лева), лв. с ДДС.

2. Посочените цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

3. Декларирам, че предлаганите цени за извършване на услугата включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на поръчката.

Дата	27/ 04 / 2018 г.
Име и фамилия	Надя Петкова
Подпис на лицето и печат	

Забележки:

- Общата цена (стойност) не може да надвишава 43 600 (четиридесет и три хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

- При несъответствие между изписаното с цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с думи.

- В случай на допуснатата грешка при посочване и изчисляване на цените, независимо от вида ѝ, неблагоприятните последици са за сметка на участника. Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП, в такива случаи, поради невъзможност за изискване на разясненията, тъй като същите водят до промени в ценовото предложение на участниците, такъв участник се отстранява.

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА

Долуподписаната Надя Кирилова Петкова [трите имена], в качеството си на Управител [качество на подписващия] на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД [точно наименование на участника] – участник в отворена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково“, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“ (изписва се предмета на обществената поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ, че


При изпълнението на поръчката ще ползваме следните технически лица:

1. Експерт по част „Хидротехническа“ и „ПБЗ“ – инж.Антония Благоева Петрова, Магистър, Строителен инженер „Хидротехническо строителство“, Диплома Серия ВДФС-97-УАСГ №001316 с рег.№ 30946/27.07.1998 г. от УАСГ София
Удостоверение за ППП № 01163 за 2018 г., телефон за контакт : 0361/6-11-10, email: ekoinjenering@abv.bg
2. Експерт по част „Хидроложки доклад“ и „ПУСО“ – инж.Никола Истилиянов Кърнолски, Магистър, Строителен инженер „Хидротехническо строителство“, Диплома Серия А-83 №017430 с рег.№ 23162/25.07.1986 г. от ВИАС София
Удостоверение за ППП № 11321 за 2018 г., телефон за контакт : 0361/6-11-10, email: ekoinjenering@abv.bg
3. Експерт по част „Геодезическо заснемане“ – инж.Иван Дойчинов Дуков - Магистър „Геодезия“ Диплома УАСГ-2010, рег.№37243 от 2010 г., УАСГ София
Удостоверение за ППП рег.№ 38053 за 2018 г., телефон за контакт : 0361/6-11-10, email: ekoinjenering@abv.bg
4. Експерт по част „Геология и Хидрология“ - Инж.Николай Василев Дачев - Магистър, Инженер Геолог, Специалност „Геология“, ВМГИ София, Диплом Серия ОЯ №011104 рег.№2619/25.04.1985 г.
Удостоверение за ППП рег.№ 04188 за 2018 г., телефон за контакт : 0361/6-11-10, email: ekoinjenering@abv.bg
5. Координатор на проекта – инж. Христо Гинев Милев - Магистър, „ССС“, Диплом УАСГ - 2014 г., рег.№ 43369/2014 г.
Удостоверение за ППП рег.№ 22070 за 2018 г., телефон за контакт : 0361/6-11-10, 0882 312447, email: ekoinjenering@abv.bg

Дата: 07.06.2018 г.

Подпис и печат:

Надя Кирилова Петкова
Управител на „Екоинженеринг“ ЕООД



АВИЗО ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ



Номер на операцията / Operation number 963B100181580WR7		Дата и час на операцията / Operation date time 07.06.2018 09:52:01	
Платете на - име на получателя / Beneficiary Name ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО			
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG23DEMI92403300116975		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC DEMI BG SF	
При банка - име на банката на получателя / Bank Name ТЪРГОВСКА БАНКА Д		Вид плащане*** / Payment Type 000000	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 994.50
PAYMENT ORDER for Budget Payment			
Основание за плащане / Details of Payment ГАР. ЗА ИЗПЪЛН. - ИНВ. ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ			
Още пояснения / Additional Details ПОДДЪРЖАНЕ ДЕСНИЯ БРЯГ НА Р. МАРИЦА			
Вид док.*/ Type 9	Номер на документа, по който се плаща/Number of Document		Дата на документа /Date
Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date		До дата / To Date	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/ Obligated Person - Legal Entity or Individual ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД			
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 108507750	ЕГН на задълженото лице / Personal Number	ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID	
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД			
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN BG94UNCR70001507122492		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCR BG SF	
При банка - име на банката на наредителя / Bank Name УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД			
Платежна система / Payment System BISERA	Такси** / Taxes 2	Вид плащане*** / Payment Type	
Дата на регистрация / Payment system registration date 07.06.2018	Номер на регистрация / Payment system registration number		
*Вид документ: 1 - декларация 5 - парт. номер на имот 2 - резизионен акт 6 - постановление за 3 - наказ. постановление принудително събиране 4 - авансова вноса 9 - други			
**Такси: 1 - за сметка на наредителя 2 - споделени (стандарт за местни преводи) 3 - за получателя			
***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет			
